



เอกสารขั้นตอนและ  
กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม  
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักผังเมืองรวม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
กระทรวงมหาดไทย

สรุปขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  
กรณีดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

- ขั้นตอนที่ ๑ การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม  
(โดยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนวางและจัดทำผังเมือง)
- ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม
- ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง
- ขั้นตอนที่ ๕ การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน
- ขั้นตอนที่ ๖ การรวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาคำร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง
- ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
- ขั้นตอนที่ ๘ การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

## ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน มุ่งเน้นกระบวนการในเชิงวิชาการ และเชิงเทคนิค ระหว่างการวางผัง ตลอดจนจนถึงการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการทั้งสิ้น ๘ ขั้นตอน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนของการดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ขั้นตอนที่ ๑ - ๗) มีระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ๒ เดือน หากกรณีการปิดประกาศ ๙๐ วัน มีคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ ๑ ปี ๔ เดือน และส่วนขั้นตอนกฎหมาย (ขั้นตอนที่ ๘) มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ เดือน โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ ๑ การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม** เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๓ กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบก่อนวางและจัดทำผังเมือง ซึ่งในขั้นตอนนี้รวมถึงการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำร่างผังเมืองรวม ตามองค์ประกอบของมาตรา ๒๒ ที่กำหนดไว้ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๘ สัปดาห์

**ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม** ขั้นตอนนี้เป็นการประชุมพิจารณาให้ความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้การวางผังเมืองรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ สัปดาห์

**ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน** ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๙ โดยจะต้องดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมือง กำหนด นอกจากนี้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมด้วย มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๒ สัปดาห์

**ขั้นตอนที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง** เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๖ กำหนดให้ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทำ เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๖ สัปดาห์

**ขั้นตอนที่ ๕ การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน** ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๙ กำหนดให้ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๘ สัปดาห์

**ขั้นตอนที่ ๖ การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง** เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ กรณีไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้อง ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ ๒ สัปดาห์ หากกรณีมีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้อง จะต้องดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาคำร้อง พร้อมแจ้งผลการพิจารณาคำร้องให้แก่ผู้ยื่นคำร้องต่อไป ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๒ สัปดาห์

**ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย** ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ สัปดาห์

**ขั้นตอนที่ ๘ การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา** ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ กำหนดให้ผังเมืองรวมออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และต้องมีสาระสำคัญตามมาตรา ๒๒ มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๒ สัปดาห์

# กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

## กรณีดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์  
และจัดทำร่างผังเมืองรวม  
(มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓)

การประชุมเพื่อพิจารณา  
ร่างผังเมืองรวม

การประชุมรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชน (มาตรา ๙)

การประชุมคณะกรรมการผังเมือง  
(มาตรา ๒๖)

การปิดประกาศ  
พร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน  
(มาตรา ๒๙)

การรวบรวม ตรวจสอบ  
พิจารณาคำร้อง และแจ้งผล  
การพิจารณาคำร้อง  
(มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑)

การจัดทำเอกสารประกอบ  
การยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓)



ตารางแสดงขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
<b>๑. การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม</b> ๑.๑ แจกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนวางและจัดทำผังเมือง ๑.๒ สำรวจ กำหนดเขตผัง ๑.๓ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังแนวคิด ๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังร่างฯ ๑.๕ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังร่างฯ	๑๘ สัปดาห์	
<b>๒. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม</b> ๒.๑ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง	๒ สัปดาห์	
<b>๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</b> ๓.๑ จัดทำเอกสาร และแผนที่แผนผัง ๓.๒ โฆษณาหนังสือพิมพ์ วิทยุและเว็บไซต์ ติดต่อกันเป็นเวลา ๗ วัน ๓.๓ ปิดประกาศ ๑๕ วัน ๓.๔ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม (มาตรา ๒๔) ๓.๕ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๓.๖ ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อประสานยุทธศาสตร์และแผนงานในการวางและจัดทำผังเมือง (เดิม)	๑๒ สัปดาห์	
<b>๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง</b> ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง (เดิม) ๔.๒ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง	๖ สัปดาห์	
<b>๕. การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน</b> ๕.๑ จัดทำต้นฉบับเอกสารปิดประกาศ ๙๐ วัน ๕.๒ ปิดประกาศ ๙๐ วัน	๑๘ สัปดาห์	
<b>๖. การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผล</b> <b>การพิจารณาคำร้อง</b> ๖.๑ รวบรวม ตรวจสอบคำร้อง และสำรวจพื้นที่ ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม ๖.๓ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง ๖.๔ ประชุมคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องของ <i>ผู้มีส่วนได้เสีย (เดิม)</i> ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ๖.๖ แจ้งผลการพิจารณาคำร้องต่อผู้ร้องฯ	๒ สัปดาห์ / ๑๒ สัปดาห์*	

หมายเหตุ : \* หมายถึง กรณีมีคำร้องฯ

ตารางแสดงขั้นตอนการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๗. การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ๗.๑ จัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ๗.๒ ตรวจสอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย	๒ สัปดาห์	
๘. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๘.๑ เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ๘.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ๘.๓ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามหนังสือถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ๘.๔ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ๘.๕ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (สลค.) ๘.๖ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม ในประกาศกระทรวงมหาดไทย ๘.๗ ส่งประกาศกระทรวงมหาดไทยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา	๑๒ สัปดาห์	
รวม	๗๒ สัปดาห์ / (๘๒ สัปดาห์*)	

หมายเหตุ : \* หมายถึง กรณีมีคำร้องฯ

# กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

## ขั้นตอนและระยะเวลา

## กรณีดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (สัปดาห์)	
๑. การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม	๑๘	๑ ปี ๒ เดือน / (๑ ปี ๔ เดือน*)
๒. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม	๒	
๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	๑๒	
๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง	๖	
๕. การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน	๑๘	
๖. การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผล การพิจารณาคำร้อง	๒ / ๑๒*	
๗. การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย	๒	
๘. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	๑๒	๓ เดือน



ขั้นตอนดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง



ขั้นตอนกฎหมาย

หมายเหตุ : \* หมายถึง กรณีมีคำร้องฯ

## แผนการปฏิบัติงานวางและจัดทำผังเมืองรวม

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานวางและจัดทำผังเมืองรวม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

### ๑. การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘ สัปดาห์

- ๑.๑ แจกองค์ประกอบครื่องส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนวางและจัดทำผังเมือง
- ๑.๒ สำรวจ กำหนดเขตผัง
- ๑.๓ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังแนวคิด
- ๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังร่างฯ
- ๑.๕ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังร่างฯ

### ๒. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม ระยะเวลาดำเนินการ ๒ สัปดาห์

- ๒.๑ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง

### ๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ สัปดาห์

- ๓.๑ จัดทำเอกสาร และแผนที่แผนผัง
- ๓.๒ โฆษณาหนังสือพิมพ์ วิทยุและเว็บไซต์ ติดต่อกันเป็นเวลา ๗ วัน
- ๓.๓ ปิดประกาศ ๑๕ วัน
- ๓.๔ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม
- ๓.๕ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- ๓.๖ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานยุทธศาสตร์และแผนงานในการวางและจัดทำผังเมือง (เดิม)

### ๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง ระยะเวลาดำเนินการ ๖ สัปดาห์

- ๔.๑ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง (เดิม)
- ๔.๒ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

### ๕. การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘ สัปดาห์

- ๕.๑ จัดทำต้นฉบับเอกสารปิดประกาศ ๙๐ วัน
- ๕.๒ ปิดประกาศ ๙๐ วัน

### ๖. การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง ระยะเวลาดำเนินการ ๒ สัปดาห์ / ๑๒ สัปดาห์ (กรณีมีคำร้อง)

- ๖.๑ รวบรวม ตรวจสอบคำร้อง และสำรวจพื้นที่
- ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม
- ๖.๓ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ๖.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย (เดิม)
- ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
- ๖.๖ แจ้งผลการพิจารณาคำร้องต่อผู้ร้อง



**๗. การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดำเนินการ ๒ สัปดาห์**

๗.๑ จัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

๗.๒ ตรวจสอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

**๘. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ สัปดาห์**

๘.๑ เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

๘.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

๘.๓ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๘.๔ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ

๘.๕ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สสค.)

๘.๖ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย

๘.๗ ส่งประกาศกระทรวงมหาดไทยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา


**หมายเหตุ :** การดำเนินการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมสามารถดำเนินการควบคู่กันได้ในบางขั้นตอน

แผนการปฏิบัติงานวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ปีที่ ๑												ปีที่ ๒												หมายเหตุ																									
		เดือนที่ ๑		เดือนที่ ๒		เดือนที่ ๓		เดือนที่ ๔		เดือนที่ ๕		เดือนที่ ๖		เดือนที่ ๗		เดือนที่ ๘		เดือนที่ ๙		เดือนที่ ๑๐		เดือนที่ ๑๑		เดือนที่ ๑๒			เดือนที่ ๑		เดือนที่ ๒		เดือนที่ ๓		เดือนที่ ๔		เดือนที่ ๕		เดือนที่ ๖		เดือนที่ ๗												
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔		๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓	๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙
<b>๑. การสำรวจ กำหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดร่างผังเมืองรวม</b>	<b>๑๘ สัปดาห์</b>	[Solid Blue Bar]																																																	
๑.๑ แจกองค์ประกอบผังเมืองส่วนท้องถิ่นให้ทราบก่อนวางและจัดทำผังเมือง																																																			
๑.๒ สำรวจ กำหนดเขตผัง																																																			
๑.๓ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังแนวคิด																																																			
๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังต่างๆ																																																			
๑.๕ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังร่างๆ																																																			
<b>๒. การประชุมเพื่อพิจารณาผังเมืองรวม</b>	<b>๒ สัปดาห์</b>																																																		
๒.๑ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง																																																			
<b>๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</b>	<b>๑๒ สัปดาห์</b>													[Solid Blue Bar]																																					
๓.๑ จัดทำเอกสาร และแผนที่แผนผัง																																																			
๓.๒ โฆษณาหนังสือพิมพ์ วิทยุและเว็บไซต์ ติดต่อกันเป็นเวลา ๗ วัน																																																			
๓.๓ ปิดประกาศ ๑๕ วัน																																																			
๓.๔ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม																																																			
๓.๕ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing)																																																			
๓.๖ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสานยุทธศาสตร์และแผนงานในการวางและจัดทำผังเมือง (เดิม)																																																			
<b>๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง</b>	<b>๖ สัปดาห์</b>													[Solid Blue Bar]																																					
๔.๑ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง (เดิม)																																																			
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง																																																			
<b>๕. การปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด ๙๐ วัน</b>	<b>๑๘ สัปดาห์</b>													[Solid Blue Bar]																																					
๕.๑ จัดทำต้นฉบับเอกสารปิดประกาศ ๙๐ วัน																																																			
๕.๒ ปิดประกาศ ๙๐ วัน																																																			
<b>๖. การรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคำร้อง และแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง</b>	<b>๒ สัปดาห์</b>													[Solid Blue Bar]												---- *กรณีมีคำร้องฯ																									
๖.๑ รวบรวม ตรวจสอบคำร้อง และสำรวจพื้นที่ (๑๒ สัปดาห์*)																																																			
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม																																																			
๖.๓ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง																																																			
๖.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย (เดิม)																																																			
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง																																																			
๖.๖ แจ้งผลการพิจารณาคำร้องต่อผู้ร้อง																																																			
<b>๗. การจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย</b>	<b>๒ สัปดาห์</b>													[Solid Blue Bar]												---- *กรณีมีคำร้องฯ																									
๗.๑ จัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย																																																			
๗.๒ ตรวจสอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย																																																			
<b>๘. การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา</b>	<b>๑๒ สัปดาห์</b>													[Solid Blue Bar]												---- *กรณีมีคำร้องฯ																									
๘.๑ เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย																																																			
๘.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย																																																			
๘.๓ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา																																																			
๘.๔ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ																																																			
๘.๕ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลด.)																																																			
๘.๖ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย																																																			
๘.๗ ส่งประกาศกระทรวงมหาดไทยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา																																																			

# กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

## กรณีดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

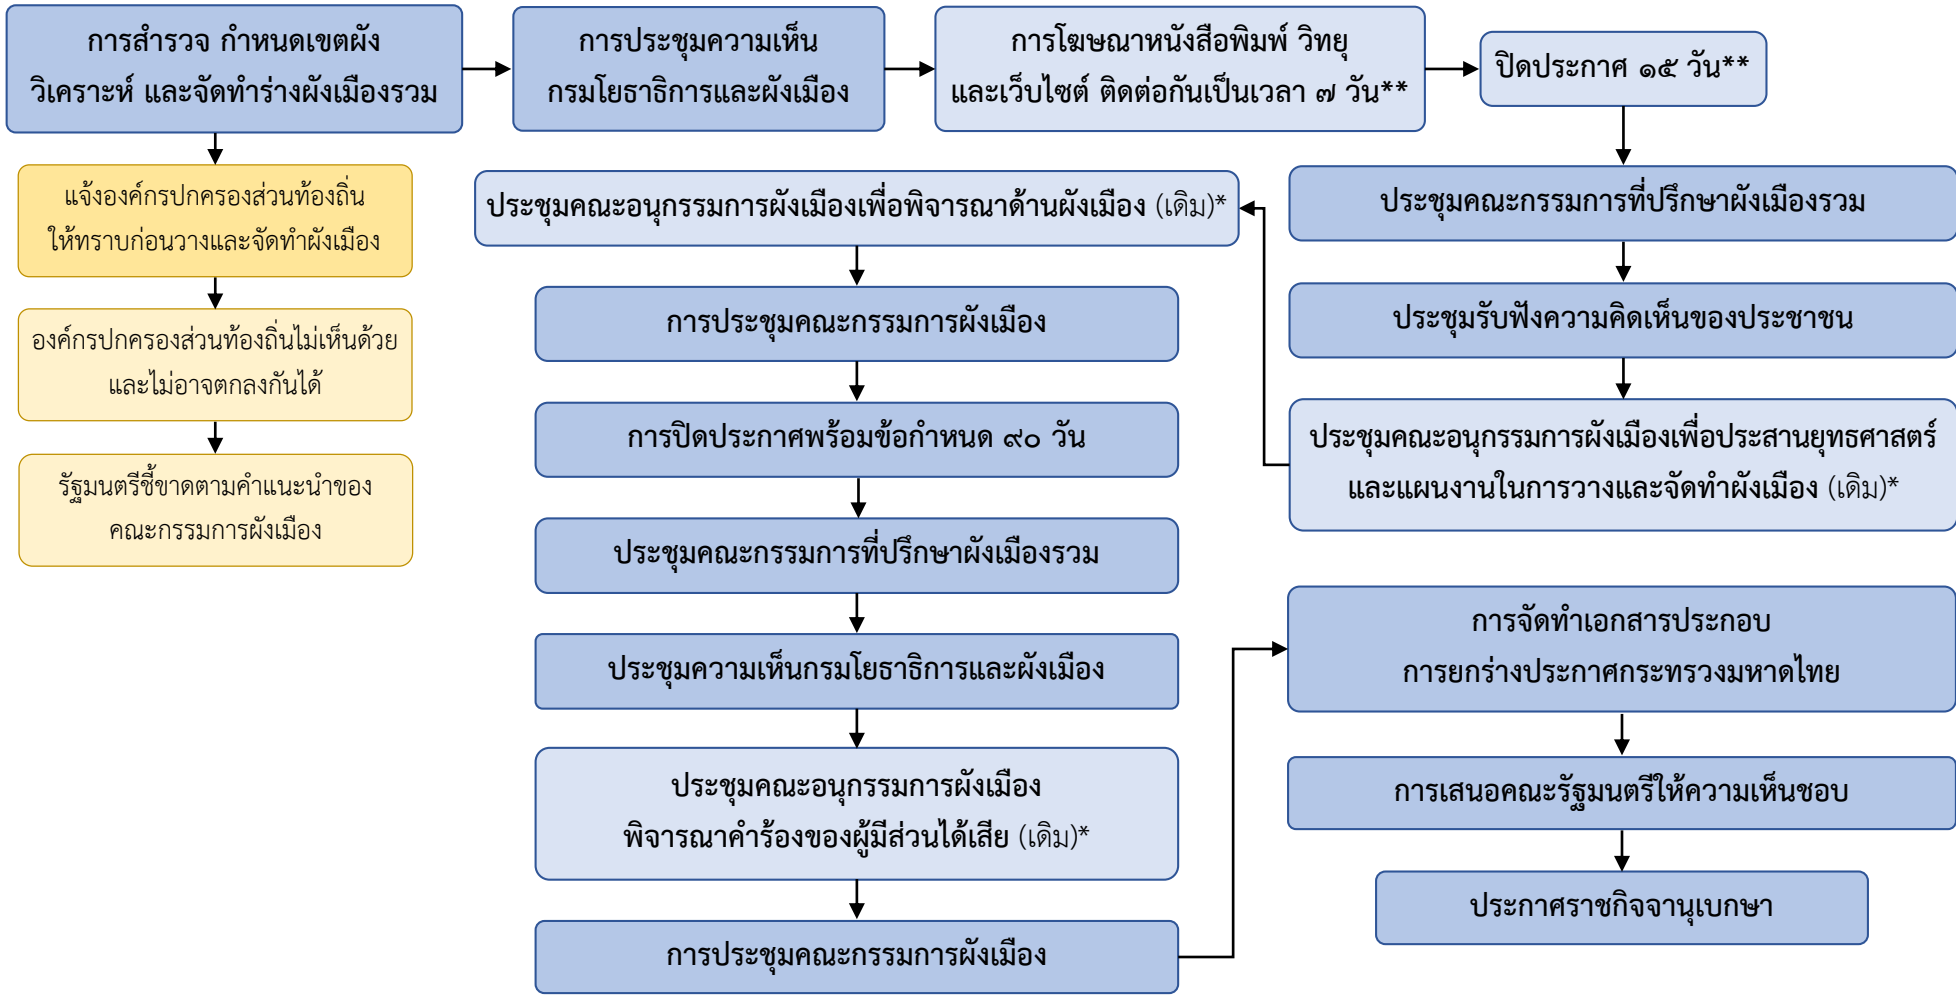

หมายเหตุ : \* แต่งตั้งโดยคณะกรรมการผังเมือง  
 \*\* ตามร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ....

